



Nabomøte E71//Rødsetvegen Ålesund Kommune

Busengdal AS

16.01.2024

FAKTA BUSENGDAL AS

- Ansatte 125 stk. (110 årsverk)
- Omsetning 327 mill.
- Fullskalaentreprenør med fokus på entrepriser som utnytter vår totalkapasitet
 - Entreprenørdrift
 - Masseforflytning
 - Transport, kran og spesialtransport
 - Stein og masse produksjon
 - VA og infrastruktur i grunn
 - Muring og plastring
 - Sjøarbeid
 - Pipehandling
- Markedsområde Møre og Romsdal

BUSENGDAL 


Omfang:

Ålesund kommune skal etablere vannforsyning som reserve for eksisterende forsyning. Utbyggingen inkluderer:

- Rødsetvegen
 - Eablering av gangfelt
 - Gatelys
 - Masseutskiftning og reasfaltering i hele gaten
 - Nytt ledningsnett
- Brusdalsvegen
 - Nytt ledningsnett
 - Gatelys
 - Masseutskiftning og reasfaltering i hele gaten

BUSENGDAL 

Organisasjonsplan

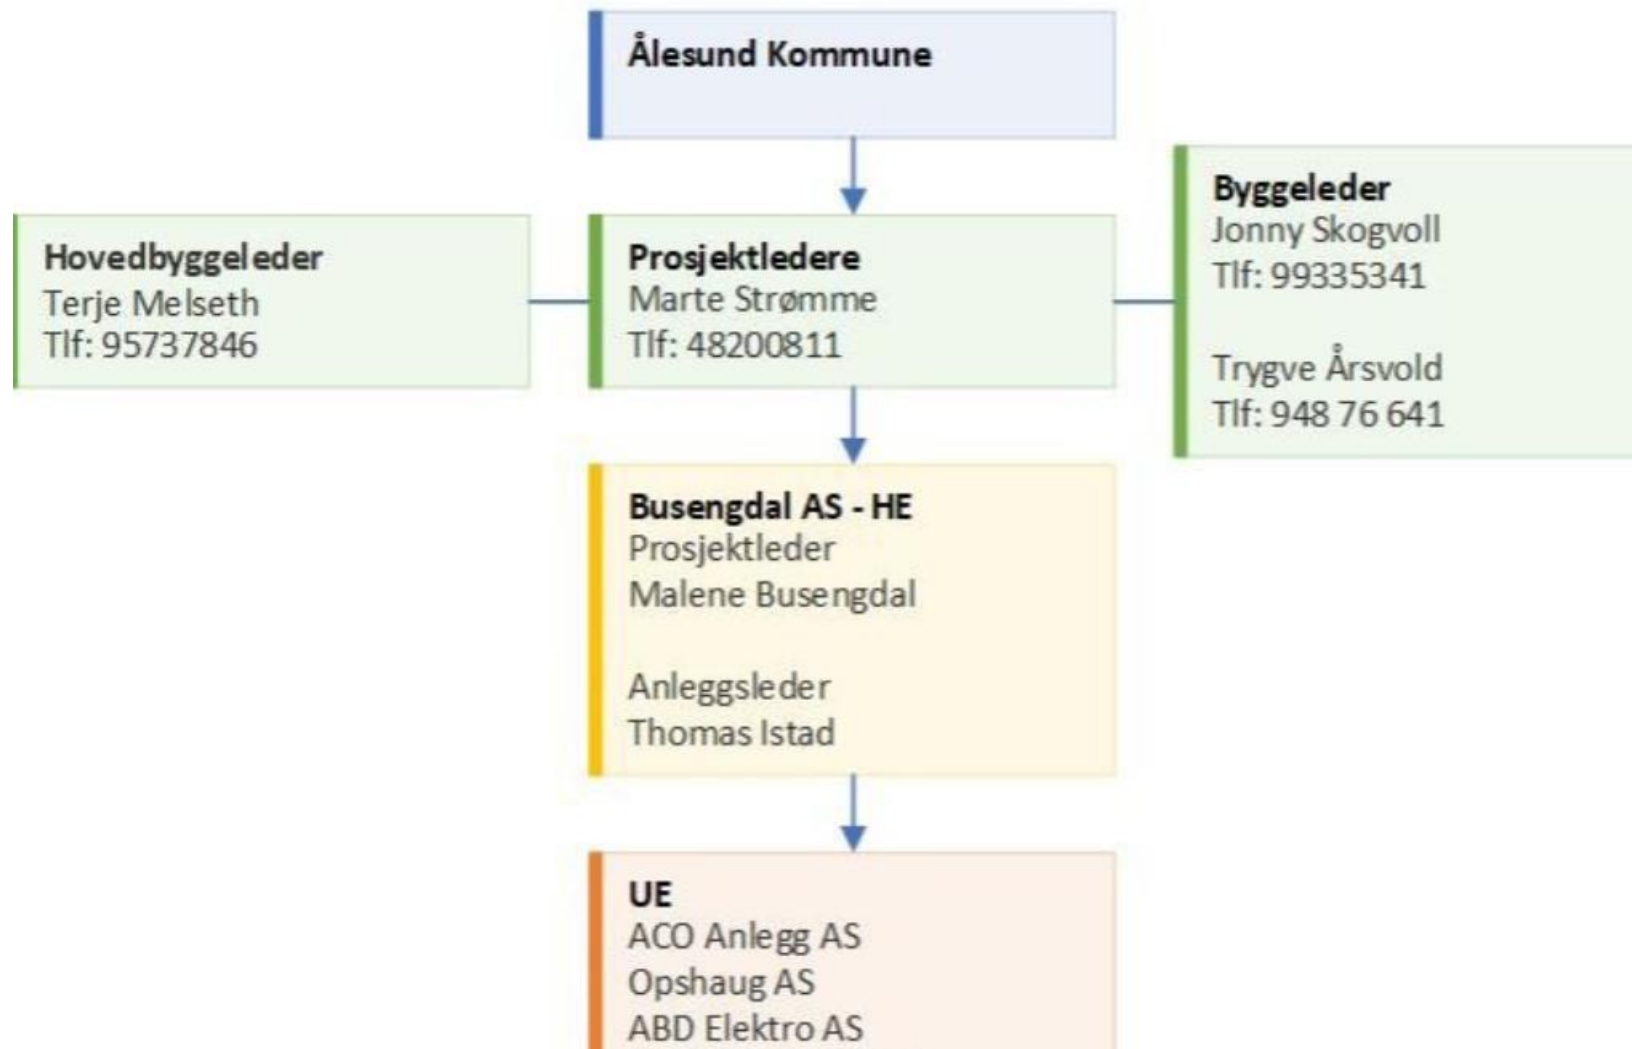

BUSENGDAL 

Arbeidstidsbegrensninger


Generelt kan anleggsarbeidene foregå i tidsrommet 07:00 – 21:00.

Generelle begrensninger:


- Støyende arbeid (eksempelvis sprenging, pigging og boring) er begrenset til hverdager i perioden kl. 07:00-17:00 for Rødsetvegen og Brusdalsvegen fra kryss Fremmeholvegen/Brusdalsvegen og vestover. For resten av Brusdalsvegen i kl. 07:00 – 19:00.

BUSENGDAL 

Kartlagt barnetråkk:

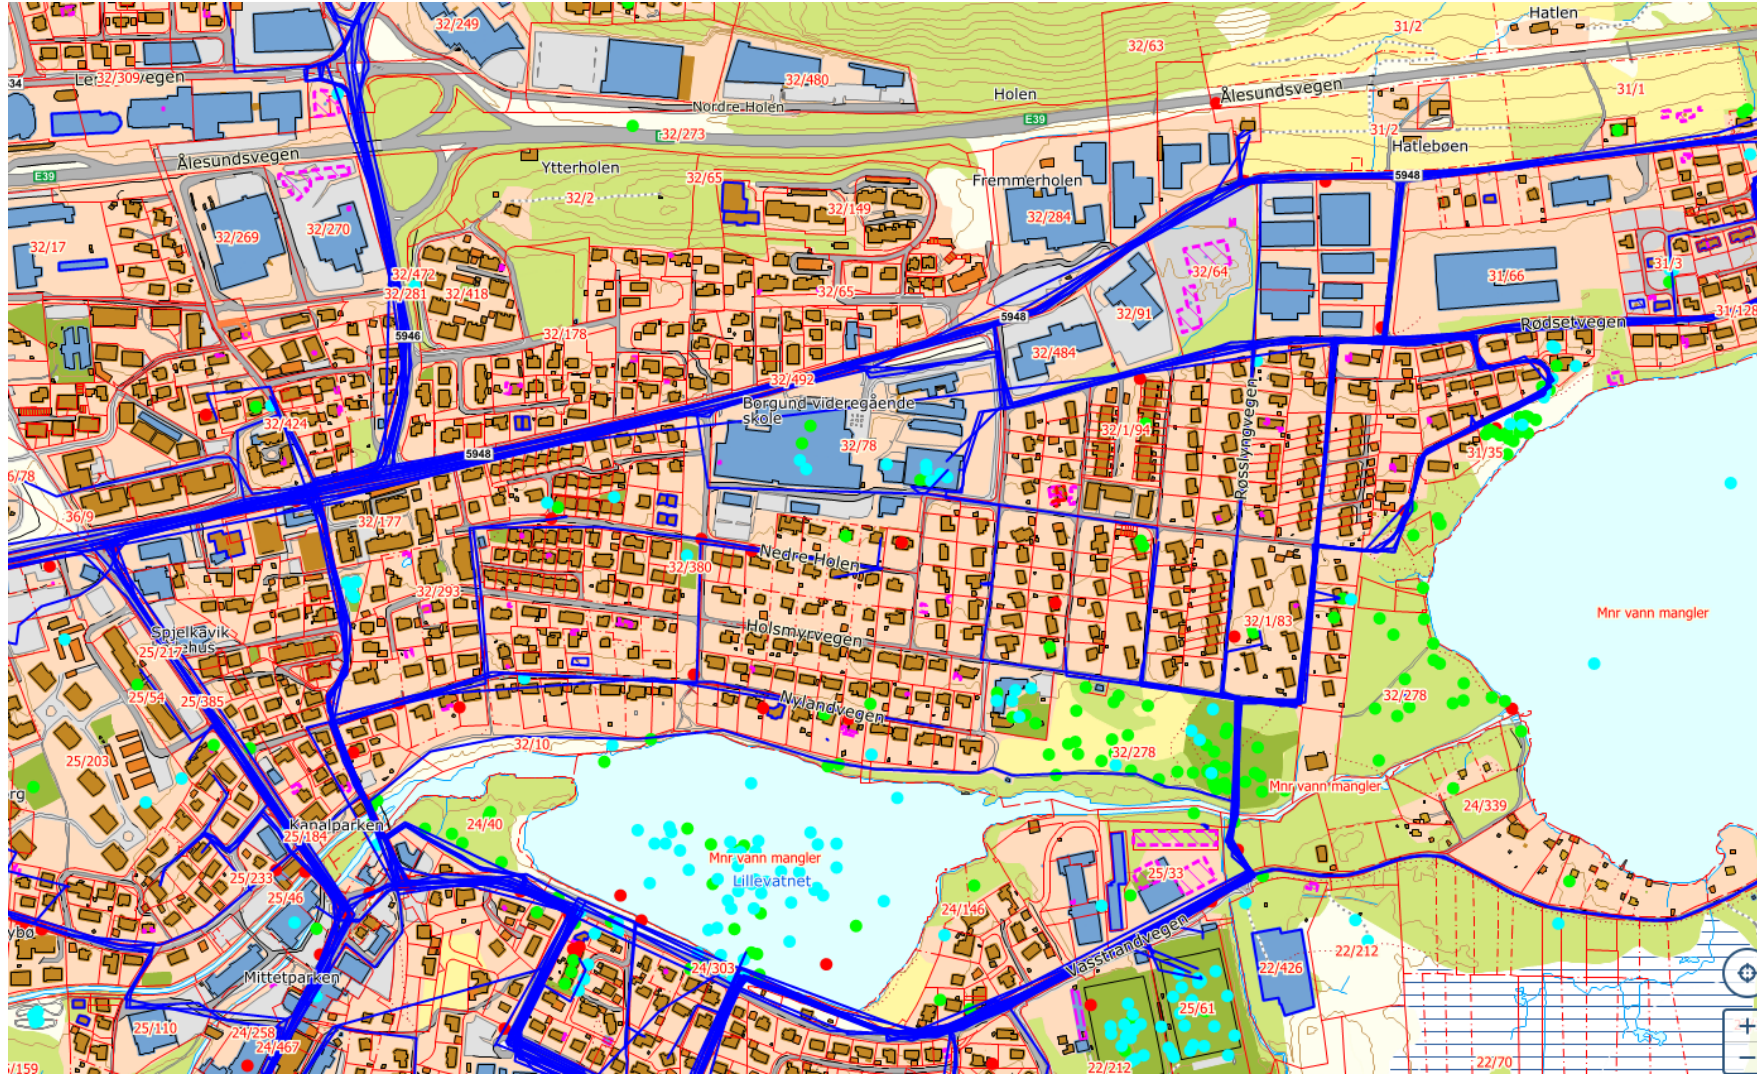

BUSENGDAL 

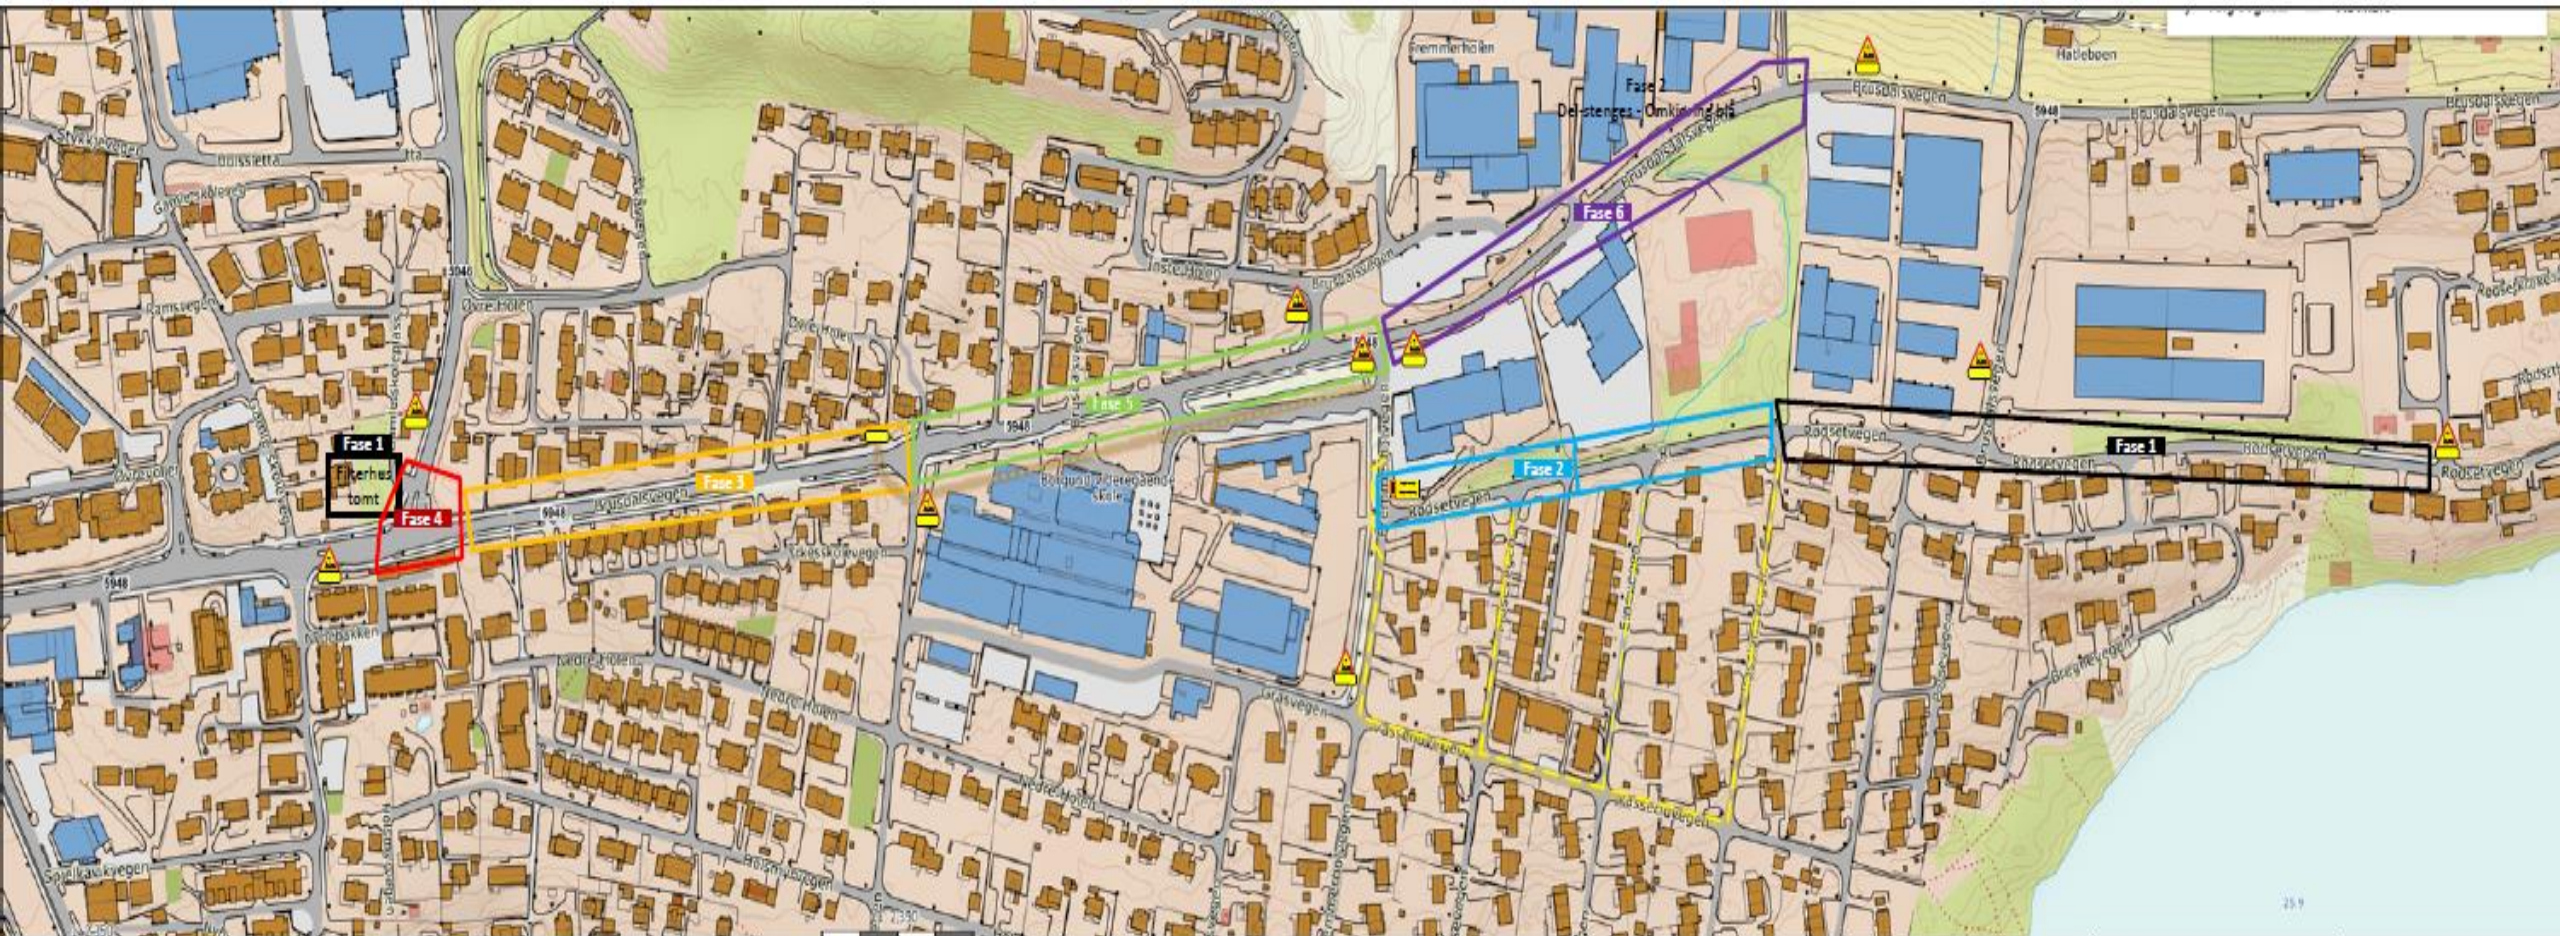

110 – Vegarbeid		Det blir tatt en vurdering hvor det er nødvendig med 110 etter risikovurdering og sikt					
Infoskilt		808 - infoskilt					
Omkjøring							
Gjennomføring rekkefølge:							
Fase 1		Fase 1 – Rødsetvegen					
Fase 2 om det kommer til utførelse		Skal hel traues					
Fase 3		Fase 2					
Fase 7 (Spjelkavik omkobling) må utføres før fase 4		Del-stenges.					
Fase 4, oppstart medio juni 25		Omkjøring alternativt omkjøringer merket med Gul stiplelinje					
Fase 5		Gangvei skiltes til nordside. Ferdig senest 25.01.2025					
Fase 6		Går relativt uavhengig av trafikk, etter som rør ligger i gangveg og veg kun skal reasfalteres.					
		Skal det traues 2/3 av veg bredden					
Vinterdrift 24/25:		Fase 3					
Fase 1: må prioritere rør som ligger i gangveg for å holde kjørefelt asfaltert så lenge som råd.		Fase 4 - utføres under Sommeren 2025 – under skoleferien					
Fase 3: Veldig kurrant ift fremkommelighet vinter		Utføres som omtalt, flytting av kryss i 3 faser.					
Fase 2: Lav ADT, og gode omkjøring muligheter. Om det kommer til utførelse		Skal hel traues					
		Fase 5					
		Gangvei omskiltes grønn stiplelinje					
		Gangvei omskiltes, utføres noe lik rødsetvegen men må ha lysregulering i under legging av rør. Tenker også her at vi bygger midlertidig busslomme på gangvei sør i fase 3 og merket nytt gangfelt. Veg vest for BVS delstenges for trafikk ca 1 uke og omkjøringsvei skiltes.					
		Skal hel traues					
		Fase 6					
		Lysregulering evt omkjøring rødsetvegen.					
		Skal hel traues					

Tidsplan:


- Oppstart Rødsetvegen januar 2025
- Rødsetvegen planlegges ferdig asfaltert ved utgangen av 2025
- Oppstart Brusdalsvegen januar 2025
- Planlagt asfaltert fra Alvikkrysset til Borgund Vgs ved utgangen av 2025
- Planlagt asfaltert fra Borgund til vannbehandlingsanlegg sommer 2026
- Ferdigstilt prosjekt September/Oktober 2026

BUSENGDAL 

Rødsetvegen:



BUSENGDAL 

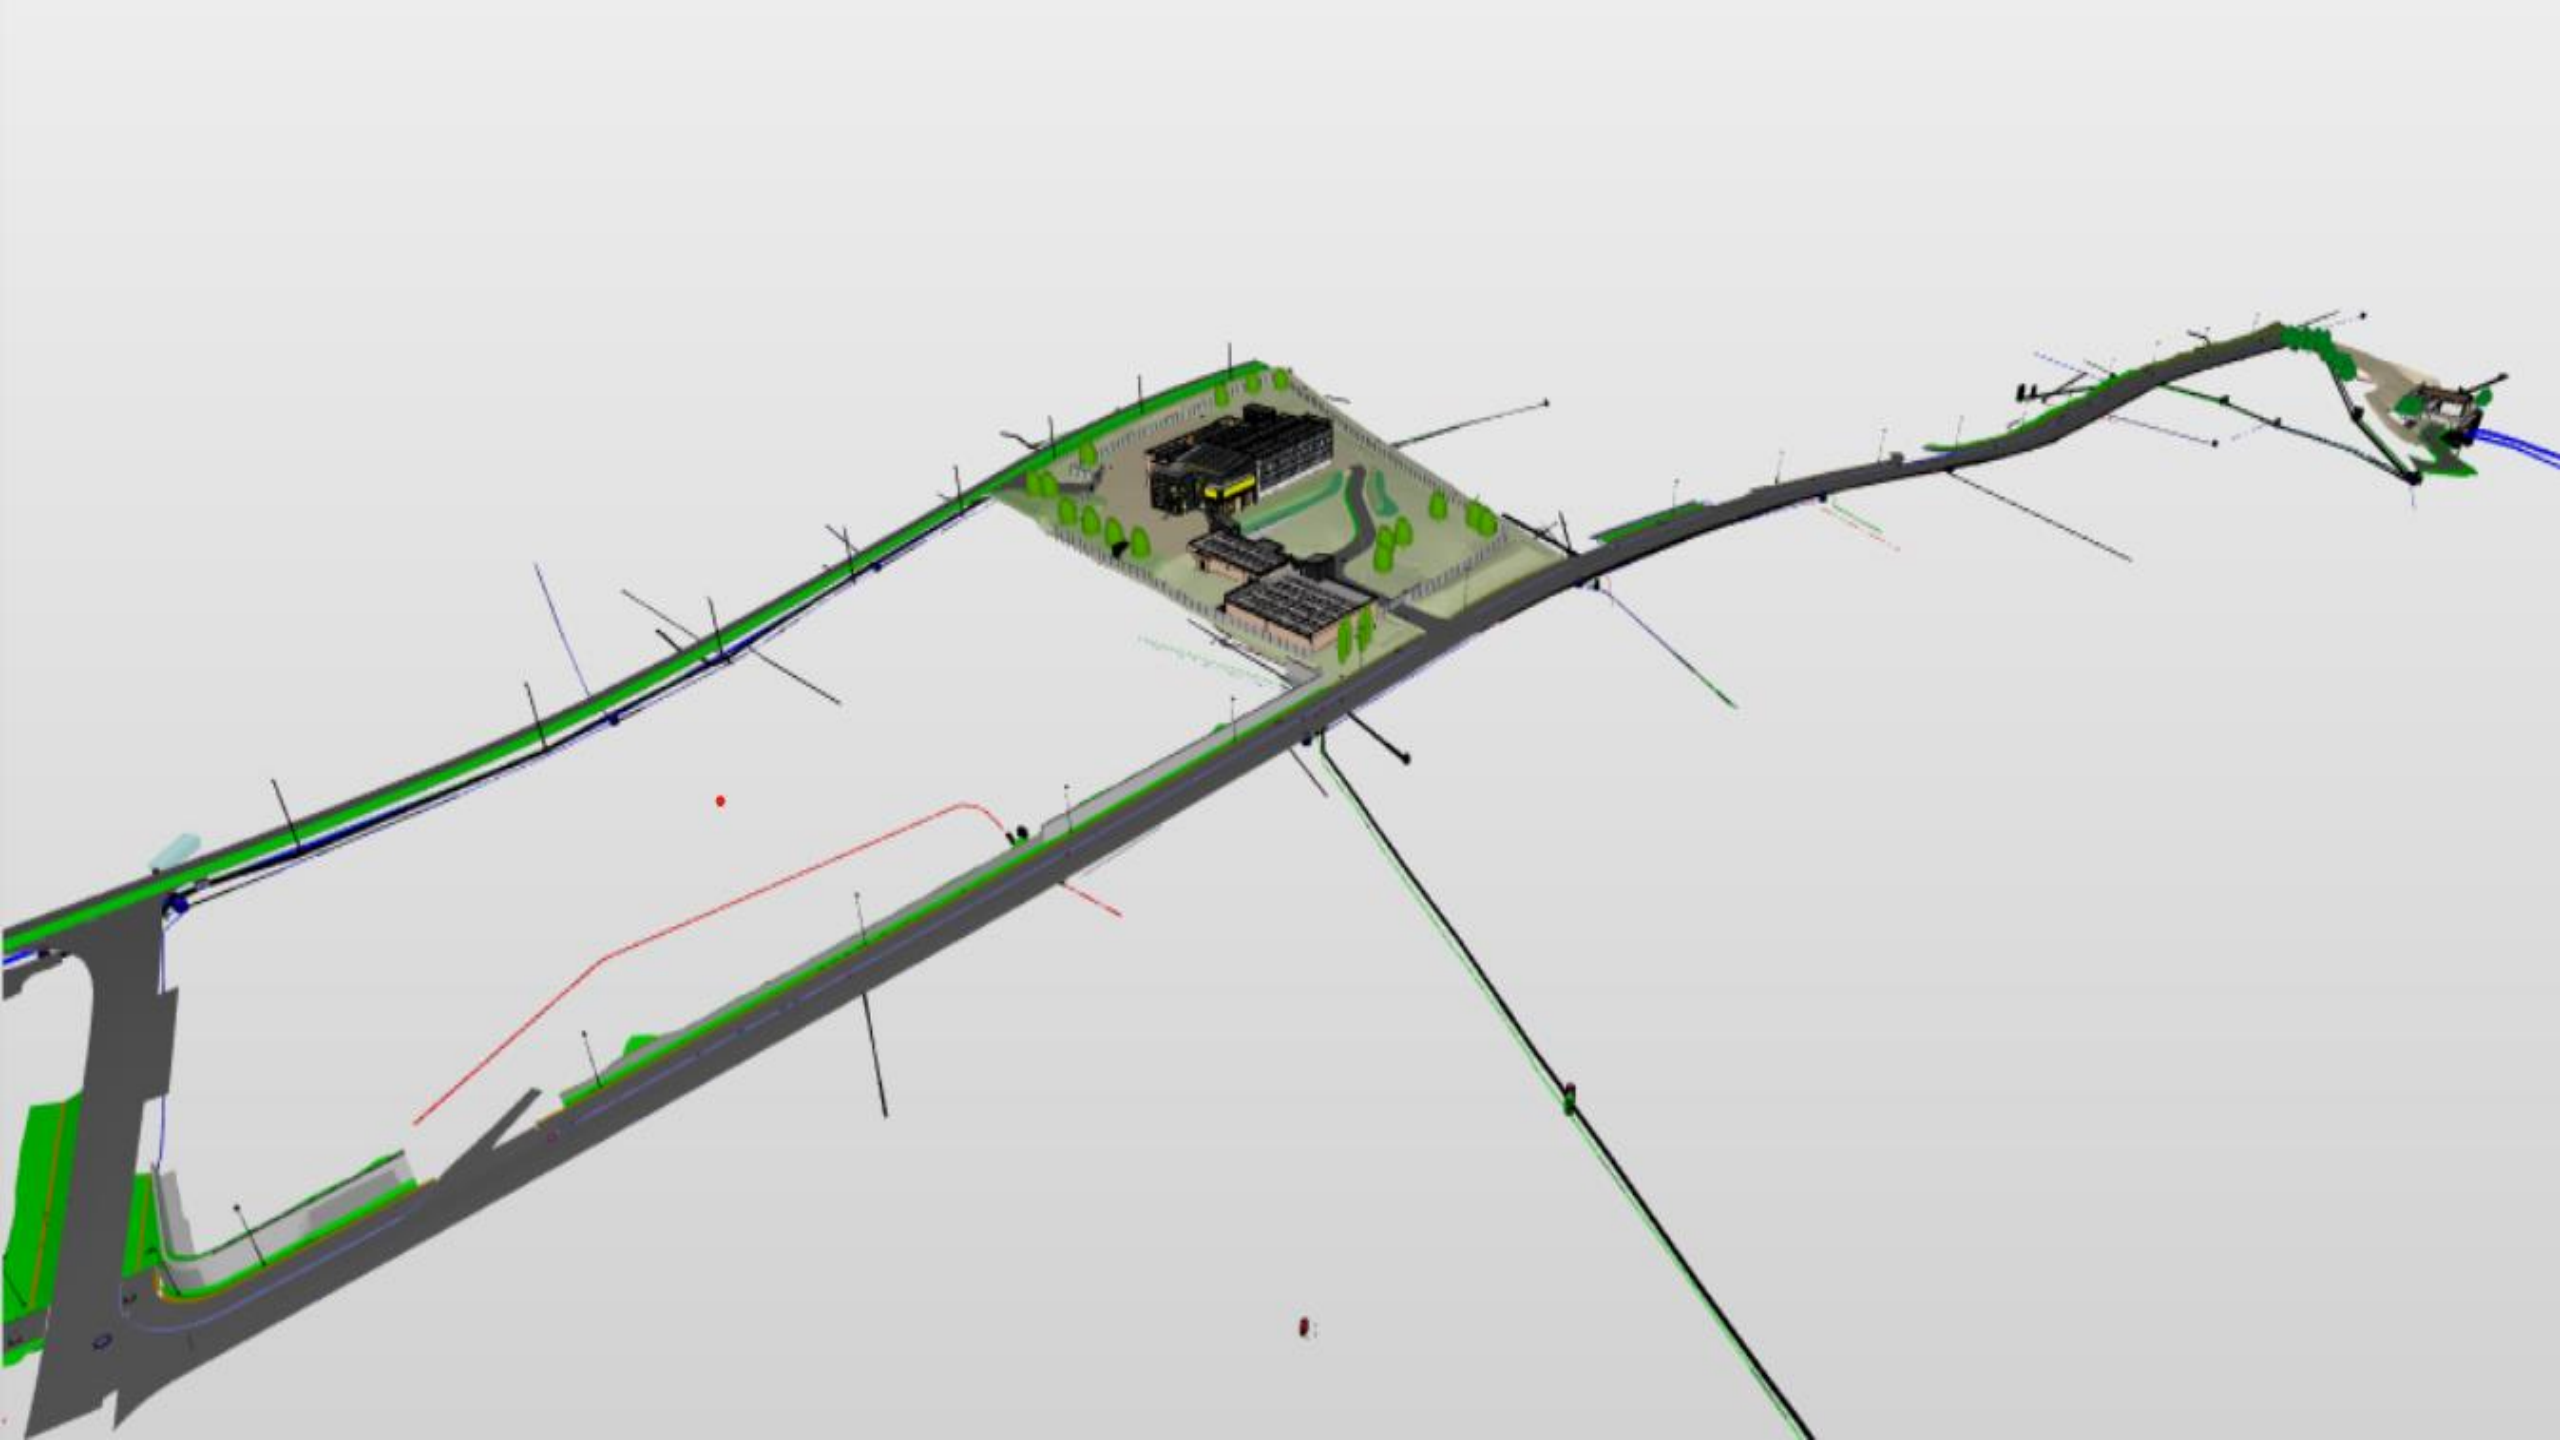

Sprengning:

- **Antatt sprengning store deler av Rødsetvegen**
- **Det er utført besiktigelse av nærliggende eigendommer i forkant og fastsetting av grenseverdier**
- **Rystelsesmåler som måler om vibrasjonene er innenfor fastsatte grenseverdier**
- **Postering personell/ vakter**
- **Alle salver varsles med støtvis signal**
- **Mulighet for varsling på melding i forkant.(Påmelding)**
- **Videreformidling til barn/unge voksne**

BUSENGDAL 



Lokal forankring og bruk av lokal kompetanse og erfaring

- Lærebedrifter
- Utplassering
- Intern utdanningsmuligheter/fagbrev rørleggerfag
- Kompetanse utveksling

An aerial photograph of a Busengdal excavator operating in a rugged, rocky landscape. The excavator is dark grey with yellow accents and is positioned diagonally across the frame. Its arm is extended, and it appears to be working on a pile of rocks and debris. The ground is covered with loose stones, dirt, and some sparse vegetation. The excavator's tracks are visible, and the overall scene suggests a construction or land-clearing project.

**Takk for oss, vi ser
fram til et godt
samarbeid**
