Nabomøte E71//Brusdalsvegen Ålesund Kommune

10.04.2025

- Samarbeid mellom 3 aktører fra Sunnmøre
- Lokal forankring og bruk av lokal kompetanse og erfaring
- Kompetanse utveksling

Organisasjonsplan

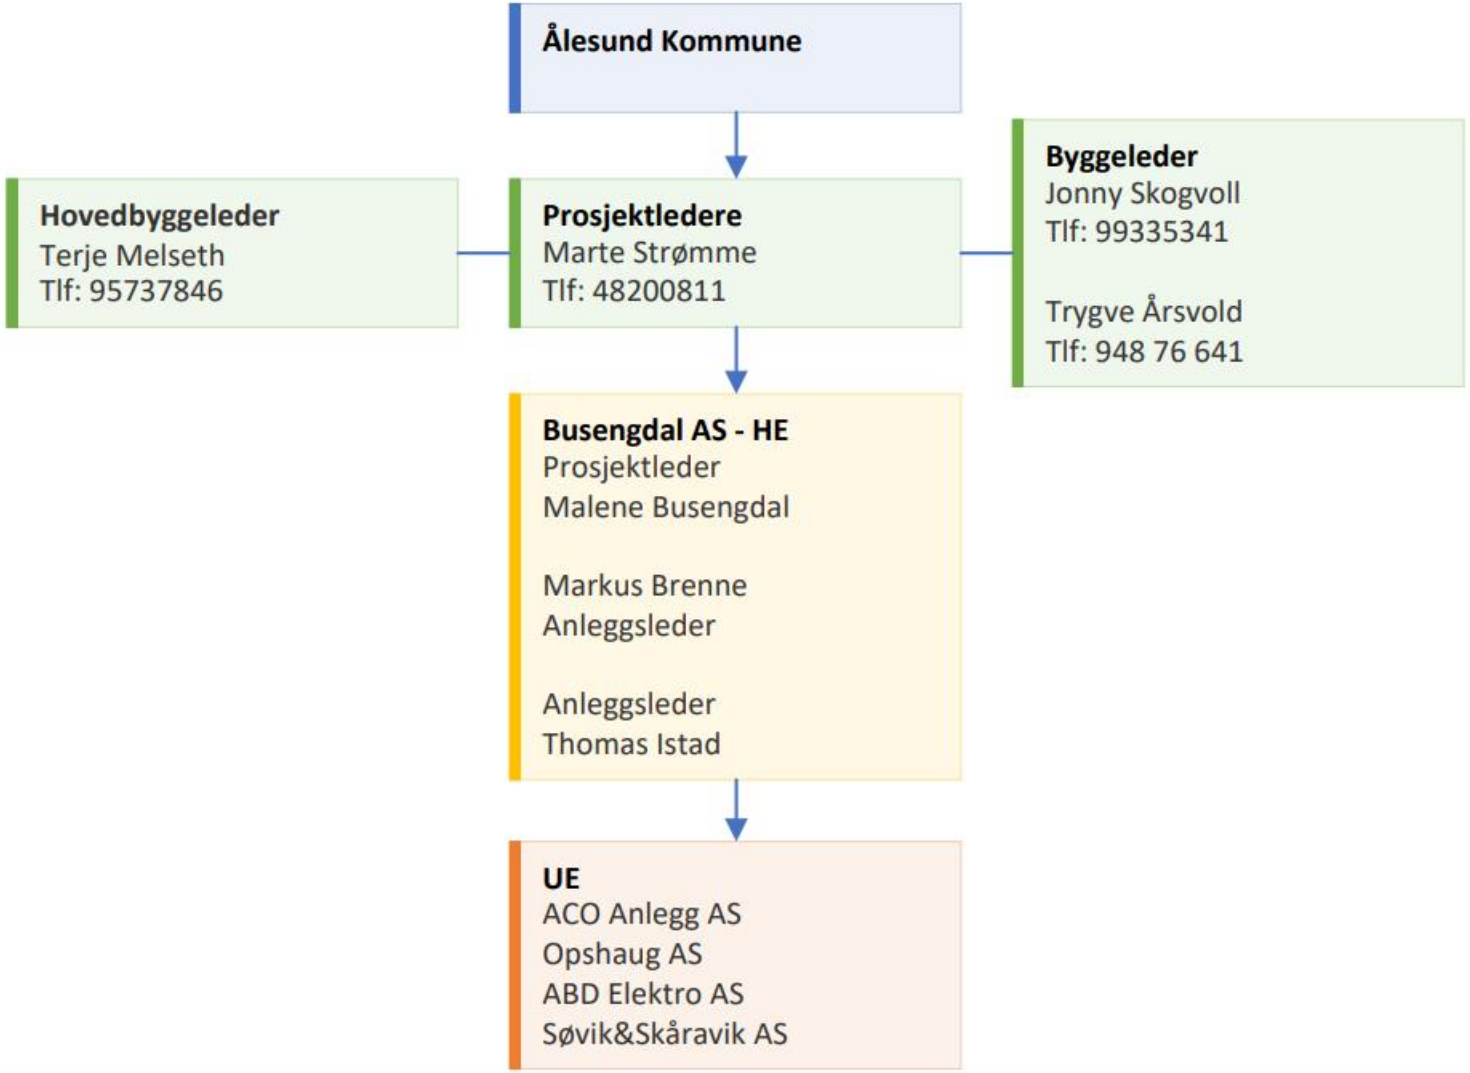

BUSENGDAL

Omfang:

Ålesund kommune skal etablere vannforsyning som reserve for eksisterende forsyning. Utbyggingen inkluderer:

- **Brusdalsvegen**
  - Nytt ledningsnett
  - Gatelys
  - Masseutskiftning og reasfaltering i hele gaten
  - Løpende kontakt med naboer. Avtaler for trafikkhandtering og omkoblinger av vatn.
  - Er i dialog med Fylke ang trafikkavvikling når vi skal grave veibanen.

BUSENGDAL

Arbeidstid:

Arbeidstidsbegrensninger

Generelt kan anleggsarbeidene foregå i tidsrommet 07:00 – 21:00.

Generelle begrensninger:

- Støyende arbeid (eksempelvis sprenging, pigging og boring) er begrenset til hverdager i perioden kl. 07:00-17:00 for Rødsetvegen og Brusdalsvegen fra kryss Fremmeholvegen/Brusdalsvegen og vestover. For resten av Brusdalsvegen i kl. 07:00 – 19:00.

BUSENGDAL

Kartlagt barnetråkk:

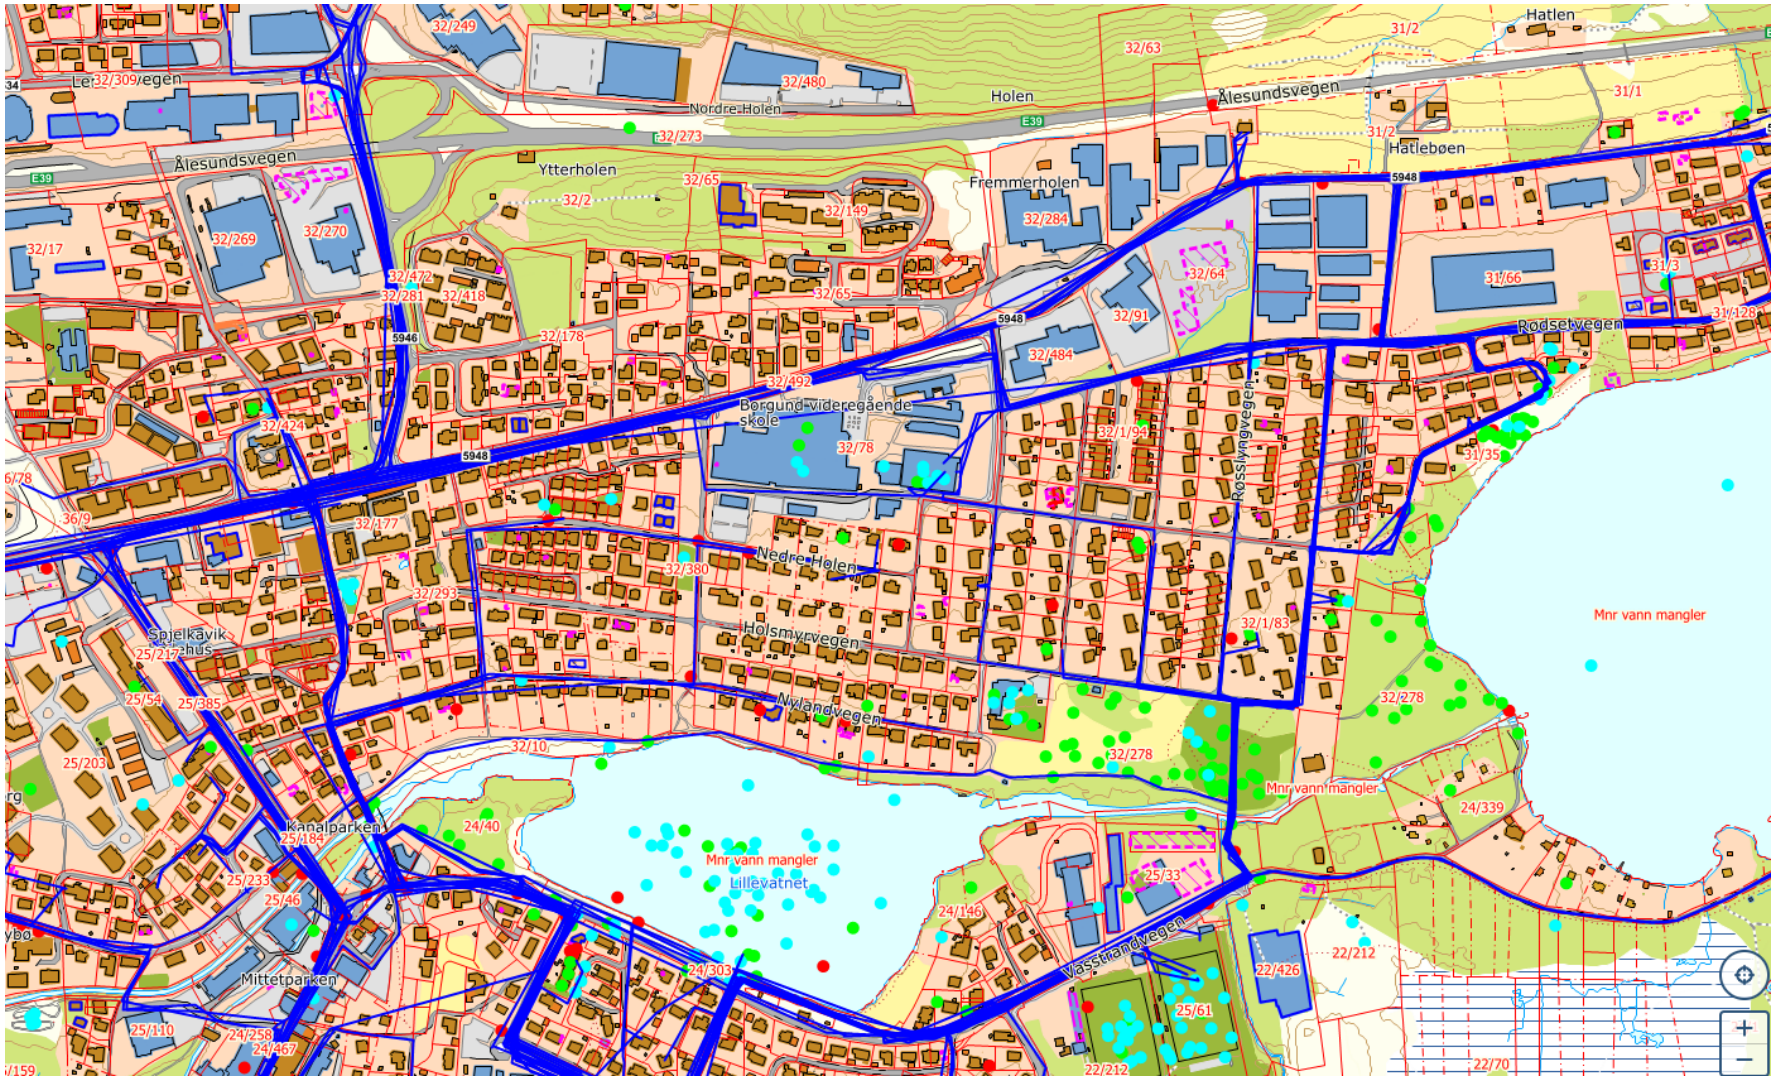

BUSENGDAL

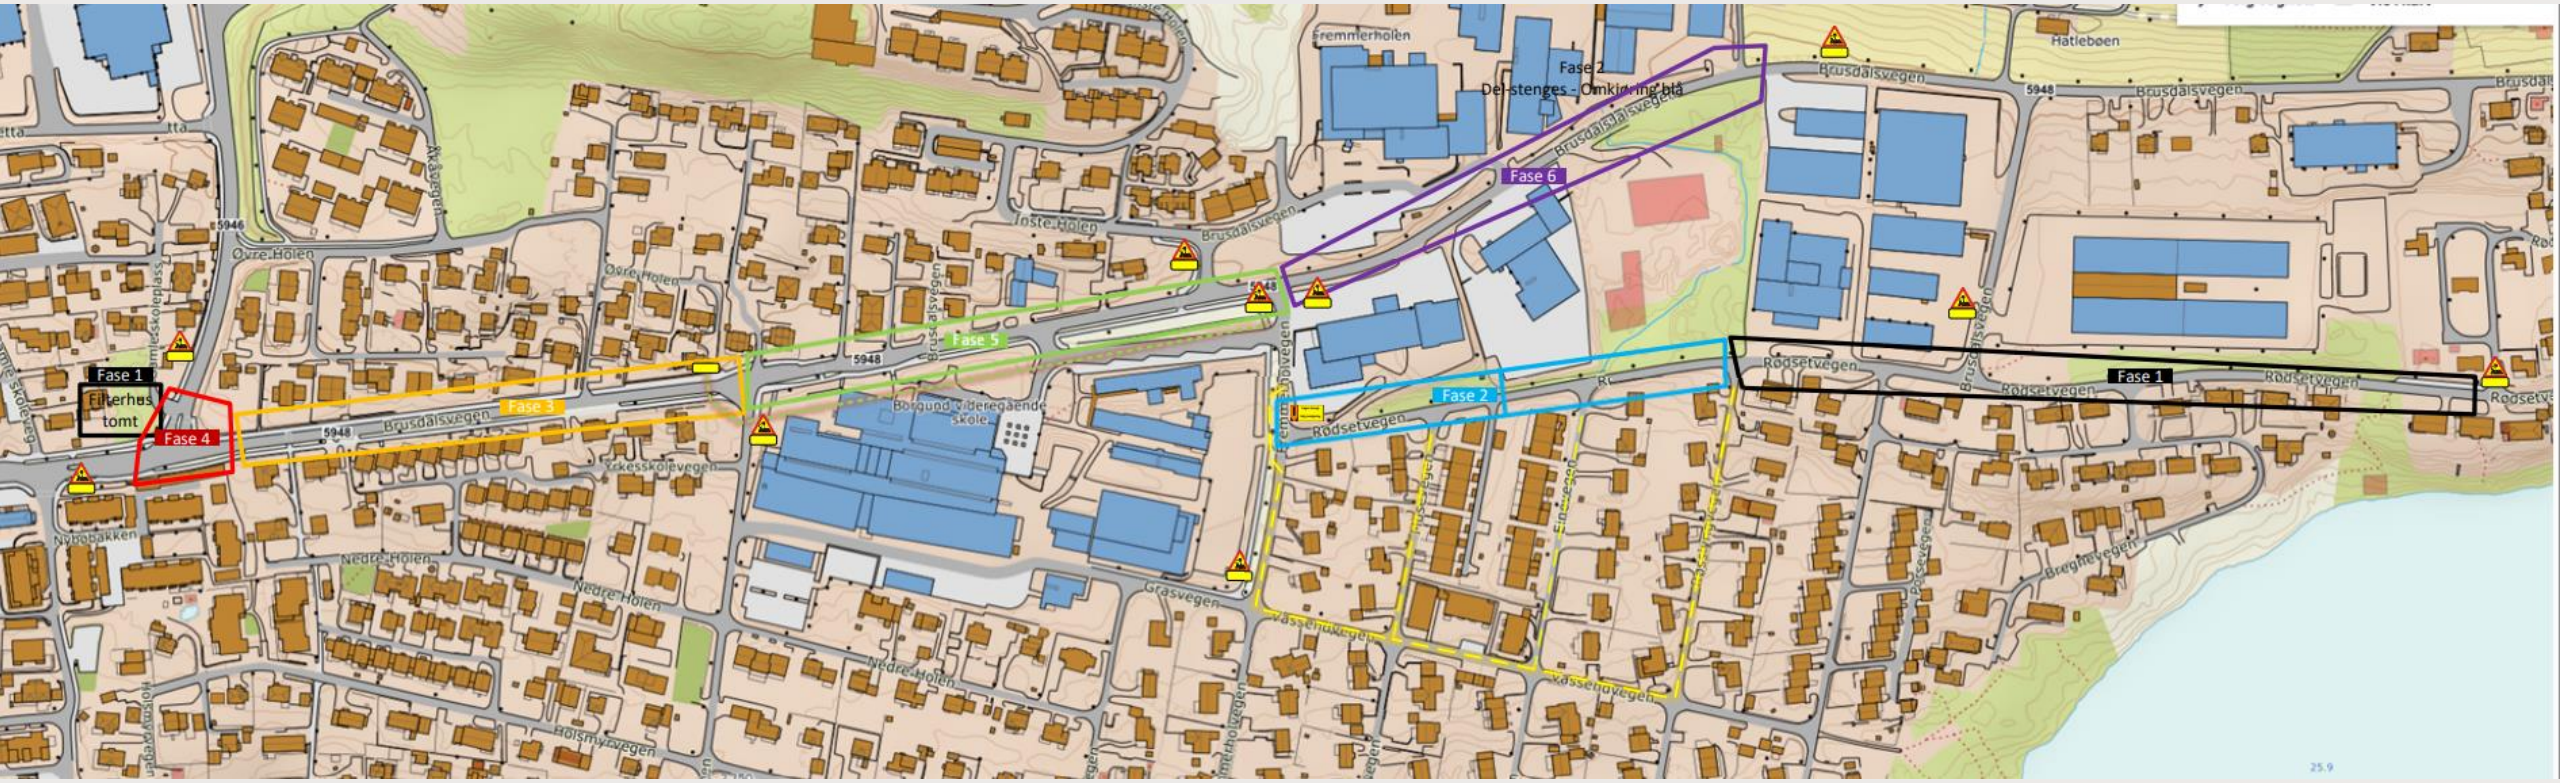

Fase 1 – Rødsetvegen	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6
Skal hel traues **Fase 1 – Filterhus tomt** Opparbeider tomt til filterhus	Del-stenges. Omkjøring alternativ omkjøringer merket med Gul stipletlinje Skal det traues 2/3 av veg bredden	Gangvei skiltes til nordside. Ferdig senest 25.01.2025 Går relativt uavhenging av trafikk, etter som rør ligger i gangveg og veg kun skal reasfalteres.	Fase 4 - utføres under Sommeren 2025 – under skoleferien Utføres som omtalt, flytting av kryss i 3 faser. Skal hel traues	Gangvei omskiltes grønn stipletlinje Gangvei omskiltes, utførese noe lik rødsetvegen men må ha lysregulering i under legging av rør. Tenker også her at vi bygger midlertidig busslomme på gangvei sør i fase 3 og merket nytt gangfelt. Veg vest for BVS delstenges for trafikk ca 1 uke og omkjøringsvei skiltes. Skal hel traues	Lysregulering evt omkjøring rødsetvegen. Skal hel traues

Tidsplan planlagt før oppstart:

- Oppstart Rødsetvegen januar 2025
- Rødsetvegen planlegges ferdig asfaltert ved utgangen av 2025
- Oppstart Brusdalsvegen April 25
- Planlagt ferdig arbeid fra Alvikkrysset til Borgund Vgs ved vinter 26
- Planlagt asfaltert fra Borgund til vannbehandlingsanlegg sommer 2026
- Ferdigstilt prosjekt høst 2026

Brusdalsvegen pel 0-300:

BUSENGDAL

Brusdalsvegen pel 300-600:

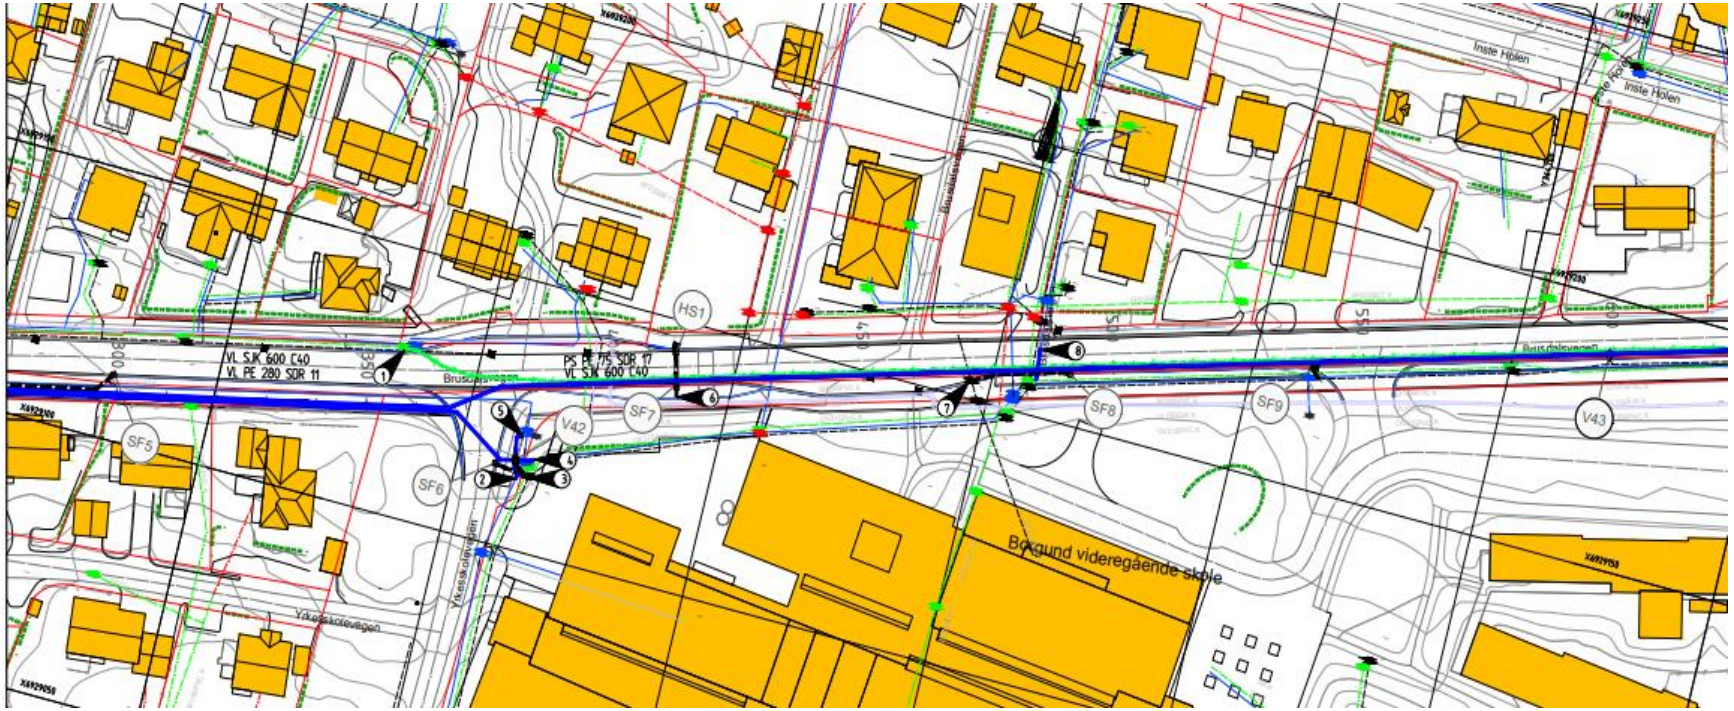

BUSENGDAL

Brusdalsvegen pel 600-875:

BUSENGDAL

Sprengning:

- Antatt sprengning i Brusdalsvegen
- Det vil bli utført besiktigelse av nærliggende eiendommer ved behov av uavhengig tredjepart.
- Rystelsesmåler som måler om vibrasjonene er innenfor fastsatte grenseverdier
- Postering personell/ vakter
- Alle salver varsles med støtvis signal
- Mulighet for varsling på melding i forkant.(Påmelding)
- Videreformidling til barn/unge voksne

- **Påmelding for varsling via epost til: teme@novaform.no eller tlf: 95 73 78 46**

BUSENGDAL

ACO
ANLEGG
BUSENGDAL
Opshaug
Takk for oss, vi er fram til et godt samarbeid
BUSENGDAL
